


Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Напредък за 2012 г.

пътят на водата



23 януари 2013 г.



В периода юни - ноември 2012 г. са сключени всички пет строителни договора в рамките на инвестиционната програма на проекта.

Тя включва:

- реконструкция на пречиствателна станция за питейни води,
- три отделни етапа на рехабилитация на водоснабдителна система (76,5 км), разширяване на канализационна мрежа (18, 5 км), рехабилитация на канализационна мрежа (21,6 км), ремонт на помпени станции,
- реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води.



4 ЮНИ 2012 Г.

Подписан е първият договор – за етап 1 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на стойност 13.8 млн. лв. без ДДС.

Изпълнител е ДРАГИЕВ И КО ООД, гр. Пловдив.

пътят на водата



За етап 1 от
мрежата
строителството ще
приключи до

27.07.2014 г.

пътят на водата



13 юли 2012 г.

Проведена е официална церемония по стартиране на строителните дейности по проекта.

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, кметът на града Таня Христова и управителят на ДРАГИЕВ И КО ООД Цанко Драгиев извършиха символична първа копка.

пътят на водата





27 юли 2012 г.

Подписан е вторият договор – за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води на стойност 19.3 млн. лв. без ДДС.

Изпълнител е ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГБС – БИОГЕСТ – ГАБРОВО.

пътят на водата



За ПСОВ
строителството
ще приключи
до

27.01.2015 г.

пътят на водата



17 АВГУСТ 2012 Г.

Подписан е третият договор – за етап 3 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на стойност 11.9 млн. лв. без ДДС.

Изпълнител е ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Пловдив.

пътят на водата



За етап 3 от
мрежата
строителството
ще приключи до

17.08.2014 г.




19 ОКТОМВРИ 2012 Г.

Подписан е четвъртият договор – за етап 2 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на стойност 14.6 млн. лв. без ДДС.

Изпълнител е СТАНИЛОВ ЕООД, гр. София.

пътят на водата

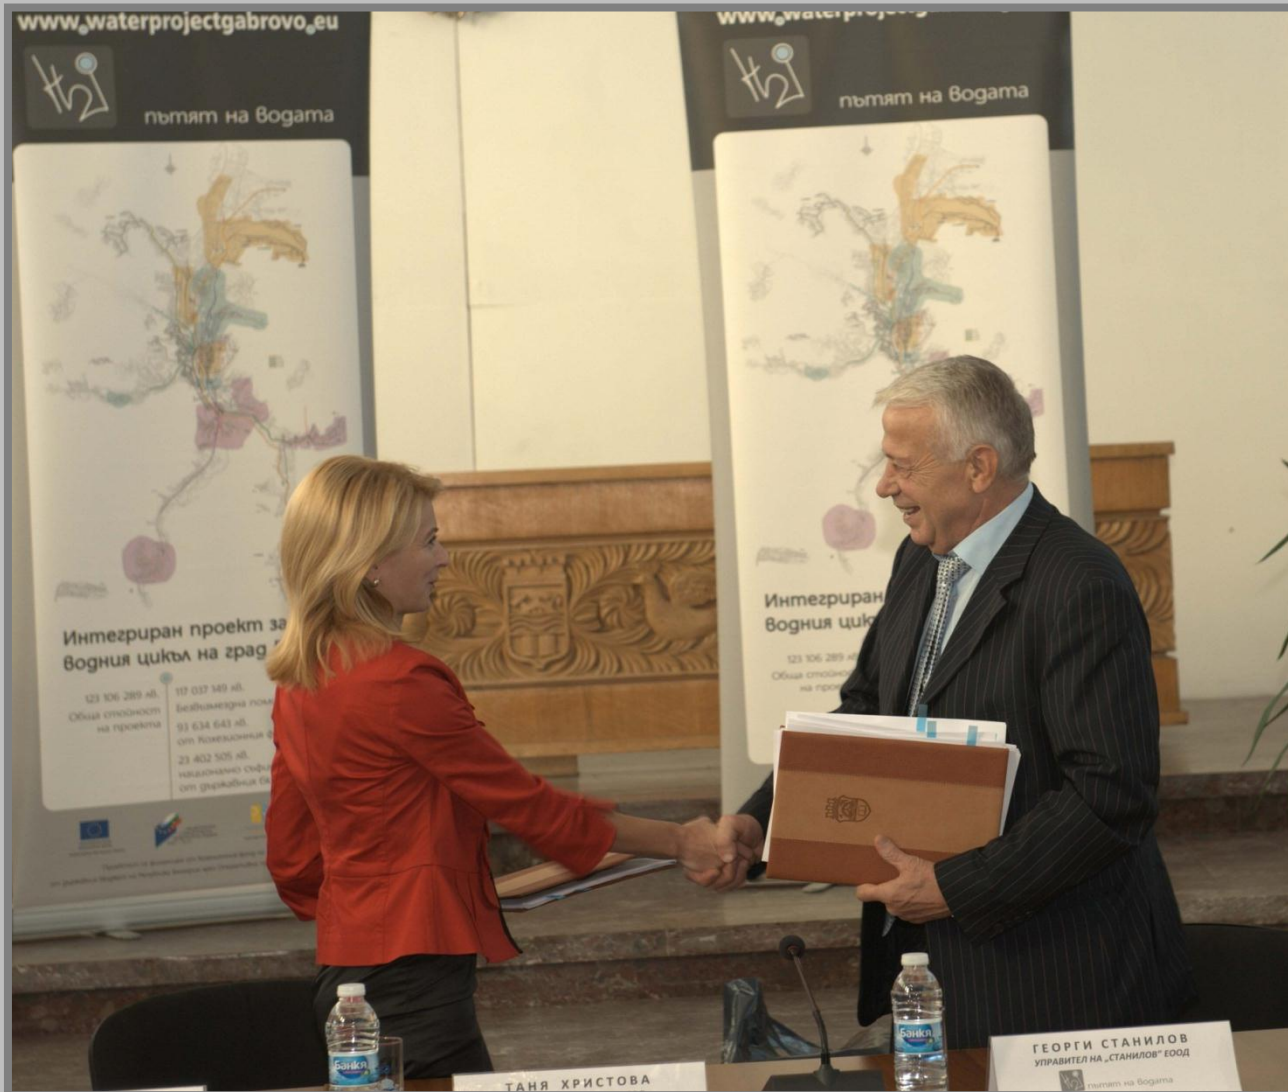

За етап 2 от мрежата
строителството ще
приключи до

11.06.2014 г.



01 НОЕМВРИ 2012 Г.

Подписан е последният, пети договор – за реконструкция на пречиствателната станция за питейни води на стойност 10.3 млн. лв. без ДДС.

Изпълнител е ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012, състоящо от испанското акционерно дружество за строителство и услуги „Копаса“ и софийските „Технострой България“ ООД и ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“.

пътят на водата



За ПСПВ
строителството ще
приключи до

17.10.2014 г.

пътят на водата



От средата на 2012 г. Община Габрово инвестира в строителство на модерна ВиК система на обща стойност над **70 млн. лв.**

Към момента се изпълняват паралелно строително – ремонтни работи и по трите етапа от ВиК мрежата.

От началото на СМР са открити **13 строителни площадки.**

пътят на водата



*Етап 1 - бул. Могилъов –
възстановяване на изкопна траншея*





*Етап 1 - ул. Свищовска – подмяна на
водопровод - полиетилен*



пътят на водата



пътят на водата



*Етап 3 - ул. Гимназиална –
подмяна на водопровод полиетилен*





Етап 3 – рехабилитация дере Хаджицонев мост





пътят на водата



*Етап 2 – ул. Градище
смесена канализация -
полипропилен*



Вече са факт и първите завършени участъци. Изпълнен е изцяло **подобект 6 от етап 1 - Връзки между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р. Янтра по „Баев“ и „Горнокрайски“ мост.**

Община Габрово и ВиК ООД Габрово поставиха изискване за първостепенно изпълнение на този подобект предвид неговата важност за обезпечаване на водоподаването при евентуални аварийни ситуации. В резултат на изпълнените СМР на подобекта, са обезпечени връзки, които ще осигурят подаване на вода от единия на другия бряг на реката както по време на изпълнение на проекта, така и при бъдещи ремонтни работи.

пътят на водата



Баян мост



пътят на водата



Горнокрайски мост – водопровод полиетилен





Към момента са изпълнени изцяло строително-монтажните и възстановителни работи по бул. Могильов, ул. Опълченска и ул. П. Славейков.

Подменени са водопроводи и по ул. Калоян, ул. Радион Умников, ул. Орлово гнездо, ул. Йоан Предтеча, ул. Гимназиална, ул. Кукуш и част от ул. Македония (от OMV до стадиона).

Изпълнен е дъждовен канал по ул. Калоян и битов канал по част от ул. Козлодуй и ул. Н. Палаузов.



Изпълнена е голяма част от довеждащ колектор за отпадъчни води в Северна индустриална зона.

Изпълнена е голяма част от рехабилитацията на дере Бялката и Хаджицонев мост.

Изпълнява се смесен канал по ул. Иван Димов и ул. Градище, който ще присъедини кв. Андреево към канализационната мрежа на града.

Започната е подмяна на водопровод по ул. Марин Дринов, ул. Лиляна, ул. Стефана Богдан Генчева, ул. Юджийн Скайлър.

пътят на водата



Рехабилитацията на ВиК мрежата се съвместява с други важни намерения за благоустрояване на Габрово.

През 2013 г. средствата за пълно възстановяване на улична настилка, бордюри и тротоари, и за трите етапа възлизат на 2.94 млн. лева, за през 2014 г. на 0.98 млн. лева.



В рамките на 2013 г.:

по етап 1 - ще бъдат възстановени около 30 000 м² асфалт, 2 000 м² паваж, 6 000 м² тротоарни настилки и прилежащи бордюри на обща стойност около 1 000 000 лв.;

по етап 2 - ще бъдат възстановени около 62 000 м² асфалт, 10 000 м² тротоарни настилки и прилежащи бордюри на обща стойност 1 300 000 лв.

по етап 3 – 28 000 м² асфалт, 8 000 м² тротоарни настилки и прилежащи бордюри на обща стойност 680 000 лв.

Възстановителните работи през 2013 ще обхванат кв. "VI" участък, кв. "Русевци", кв. "Трендафил", кв. "Варовник", кв. "Баждар"-50%, ЦГЧ, кв. Лъката, кв. Радичевец, кв. Беленци.



Брой искания за средства към МЗ на ОПОС – 9

Обща стойност на извършените от Община Габрово разходи от началото на проекта до последния отчетен период към МОСВ към 20.12.2012 г. :

13.7 млн. лв. с ДДС

или

11,16% финансово изпълнение на проекта,

от които **12.6 млн. лв.** за авансови плащания по строителните договори

пътят на водата




През тази година Община Габрово инвестира целенасочени усилия в посока придаване на качествено нова функционалност на информационния портал на Интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово.

На него е поместено специално разработено уеб приложение, базирано на географска информационна система (ГИС).

пътят на водата



www.waterprojectgabrovo.bg

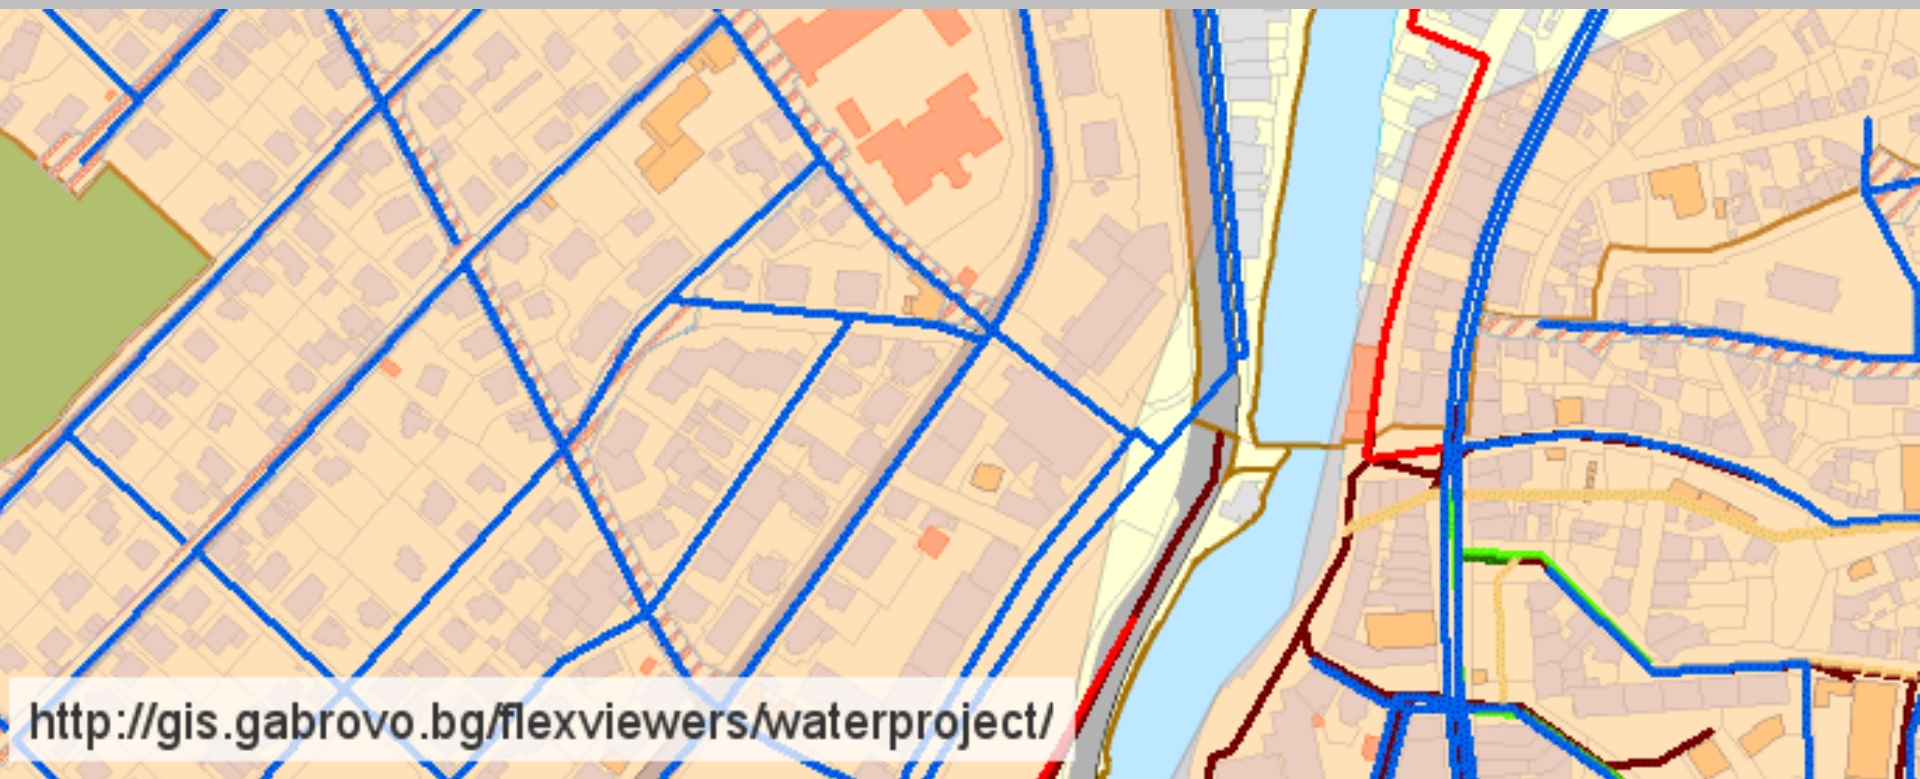

<http://gis.gabrovo.bg/flexviewers/waterproject/>

пътят на водата



Уеб приложението е визуализирано върху основа на интерактивна кадастрална карта, върху която са нанесени всички трасета, предмет на проекта.

С влизането в модула, потребителят получава достъп до карта с данни за проектните параметри.

Тъй като подмяната на ВиК инфраструктурата е разделена на три отделни териториални етапа, всеки от етапите е представен в отделен слой.


пътят на водата



По този достъпен начин всеки може да направи справка за предвидените за подмяна трасета на ВиК мрежата по квартали, улици, дори на ниво конкретен имот.

Уеб приложението съдържа и информация за улиците от града, които подлежат на напълно възстановяване на настилките отвъд стандартното възстановяване на изкопната траншея.

пътят на водата

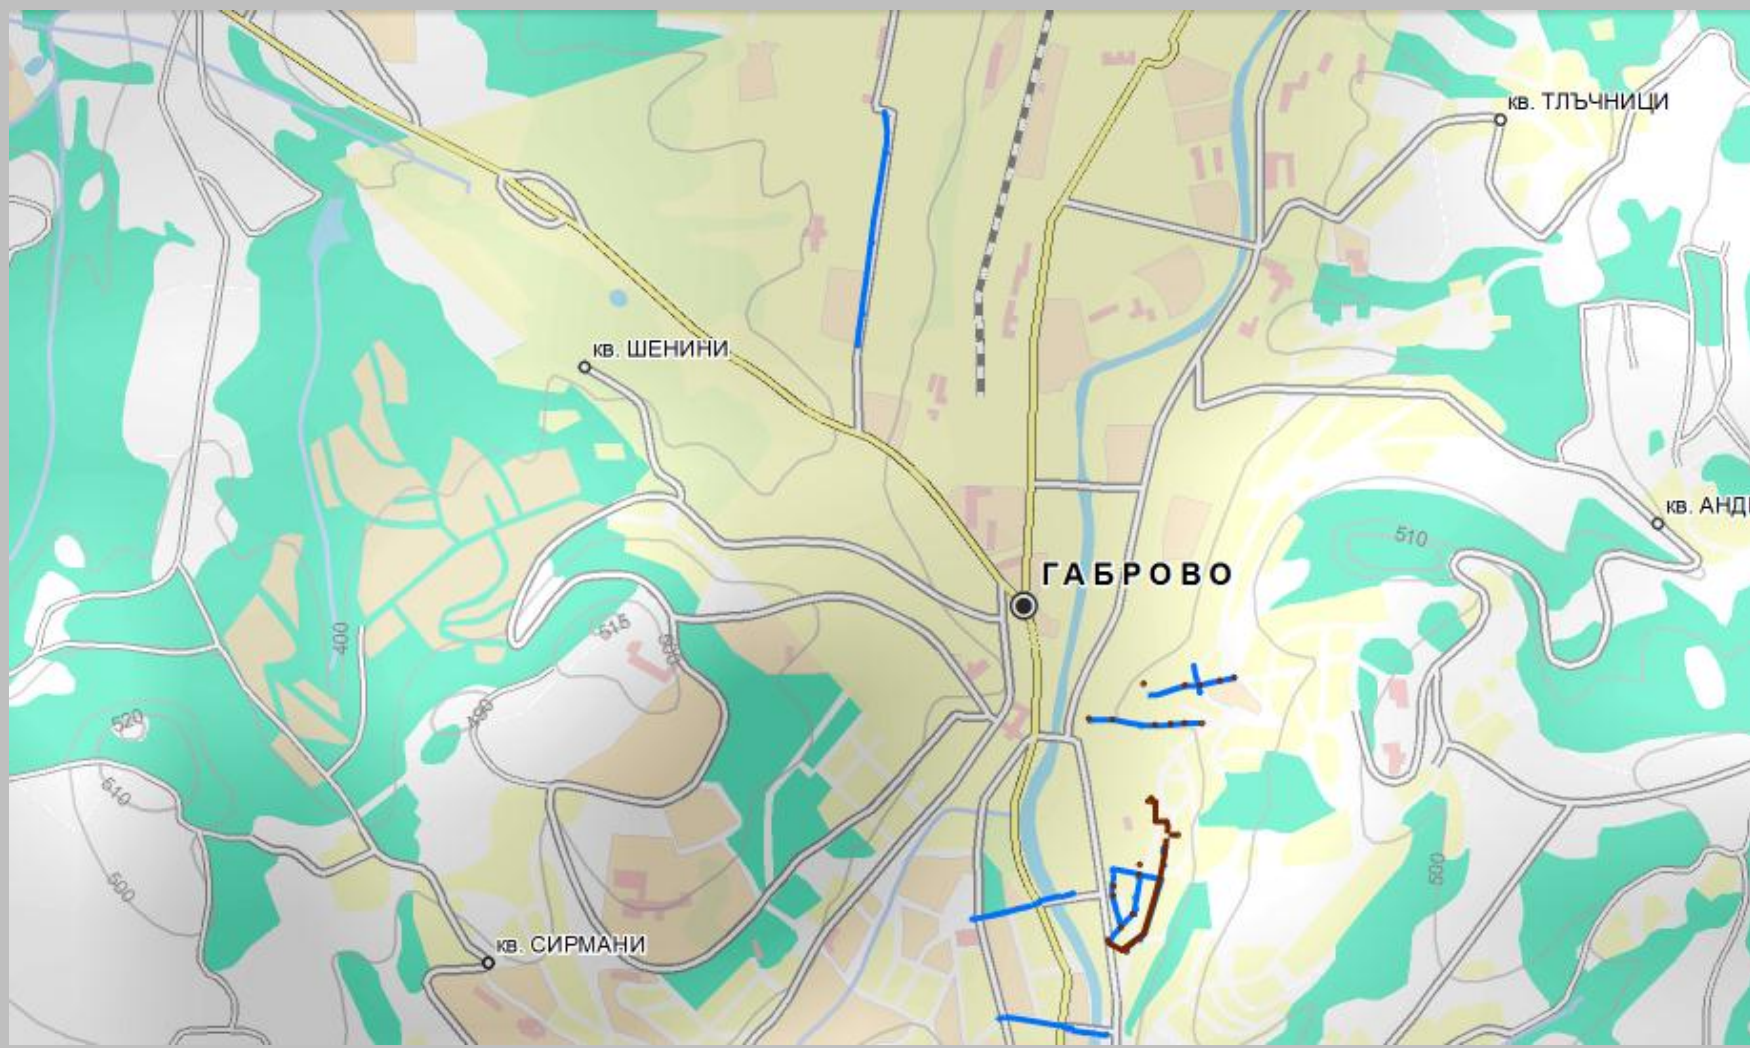

пътят на водата



На интернет страницата на проекта е поместено и меню „Актуално за СМР“, където се публикува информация относно нарушения във водоподаването и временната организация на движението.

Менюто позволява по зададени данни за териториален обхват (квартал) и обект (улица) да се филтрира информация за всички актуални новини от строителството за конкретно селектирания участък от обхвата на проекта.

Временна организация на движението по ул. „Иван Димов“ и ул. „Острец“ ● 22 Януари 2013

Временна организация на движението по ул. "Градище" ● 10 Януари 2013

Завършен е подобект 6 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата - етап 1 - Връзки между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р.Янтра по „Баев“ и „Горнокрайски“ мост ● 28 Ноември 2012

[Виж всички](#)

Актуално за СМР

Териториален обхват:

Обект:

Филтрирай

Временна организация на движението по ул. „Иван Димов“ и ул. „Острец“ ● 22 Януари 2013 / Новини

Авария във връзка със строителните работи на етап 2 от подмяната на ВиК мрежата ● 11 Януари 2013

Временна организация на движението по ул. "Градище" ● 10 Януари 2013 / Новини

[Виж всички](#)

Покана към обществеността
Надзорната комисия за наблюдение на проект за водния цикъл на



Време: 23 януари 2013 г. ()
Място: Ритуалната зала на

[Виж всички](#)

E-mail абонамент

- ☐ Новини
☐ Актуално за СМР

[Абонирай се](#)

пътят на водата



По време на годишния форум на местните власти, организиран от Националното сдружение на общините в Република България, Община Габрово получи приза на Министерството на околната среда и водите за най-оригинално представяне на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”

за интерактивната интернет страница на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, разработена в рамките на цялостната комуникационна кампания на Община Габрово за осигуряване на комплекс от мерки за публичност, информация и визуализация на изпълнението на проекта.

пътят на водата



Благодарим за вниманието!

ОБЩИНА ГАБРОВО

Звено за изпълнение на проект

пътят на водата

тел.: 066/ 818 377

Факс: 066/809 371

office@waterprojectgabrovo.eu

www.waterprojectgabrovo.eu



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Инвестираме във Вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Решения за
по-добър живот

www.opc.moeiw.government.bg
